

**LAPORAN PEKERJAAN
PENGADAAN KABEL DAN PULLING KABEL
GEDUNG BIOLOGI DENGAN MENGGUNAKAN
UDITCH + PENGADAAN KABEL DAN PULLING
KABEL DEPARTEMEN STATISTIKA (TANPA
UDITCH)**



LOKASI PEKERJAAN :
PT. WIGUNA INSTITUT TEK [REDACTED]

PRIODE PEKERJAAN :
1 APRIL 2024 – 6 JULI 2024

KONTRAKTOR :
PT. WIGUNA [REDACTED]

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1. Survey Pekerjaan.....	3
2. Pekerjaan Galian U-Ditch	4
3. Pemasangan U-Ditch	8



1. Survey Pekerjaan

31 Januari 2024 - Survey Lokasi pekerjaan



2. Pekerjaan Galian U-Ditch



4 Juni 2024 - Pekerjaan galian U-Ditch







7 Juni 2024 - Pekerjaan galian U-Ditch

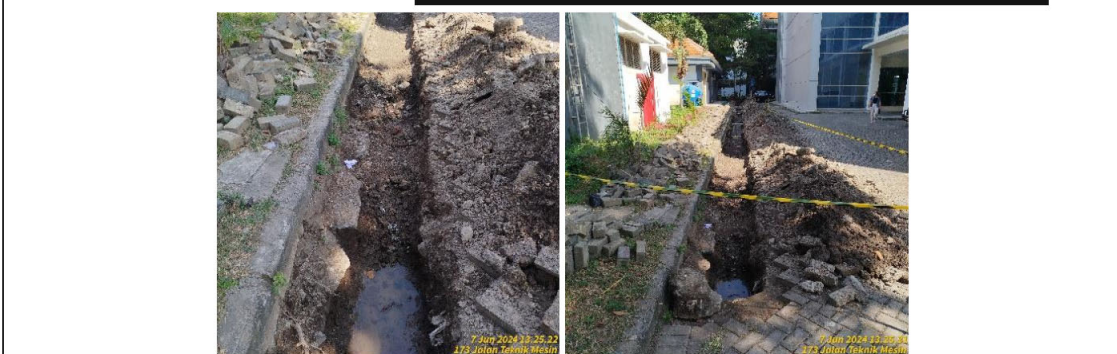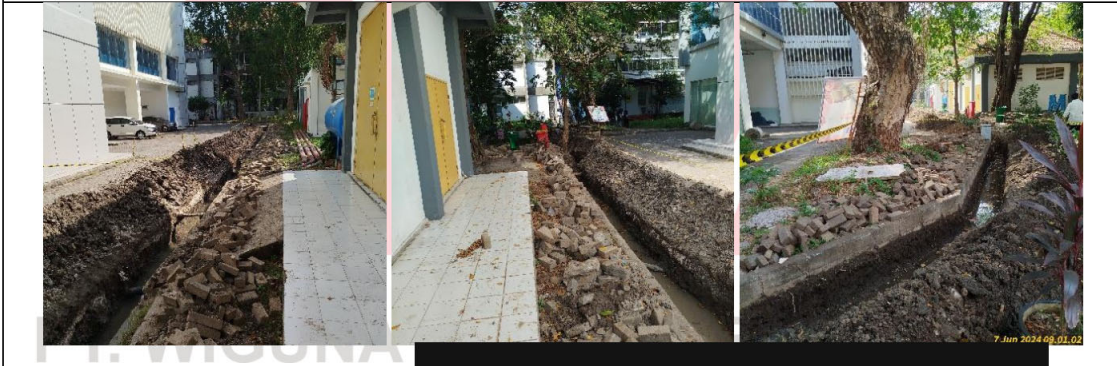

8 Juni 2024 - Pekerjaan galian U-Ditch



11 Juni 2024 - Pekerjaan galian U-Ditch




3. Pemasangan U-Ditch

8 Juni 2024 – Material U-Ditch on site



10 Juni 2024 - U-Ditch on site & pekerjaan pemasangan U-Ditch

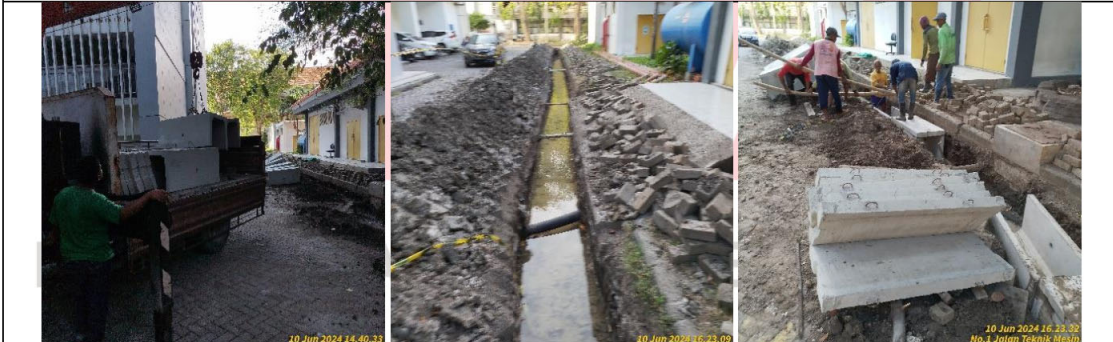

12 Juni 2024 - U-Ditch on site & pekerjaan pemasangan U-Ditch





U-Ditch on site & pekerjaan pemasangan U-Ditch



13 Juni 2024 - U-Ditch on site & pekerjaan pemasangan U-Ditch







19 Juni 2024 – U-Ditch on site



20 Juni 2024 – U-Ditch on site

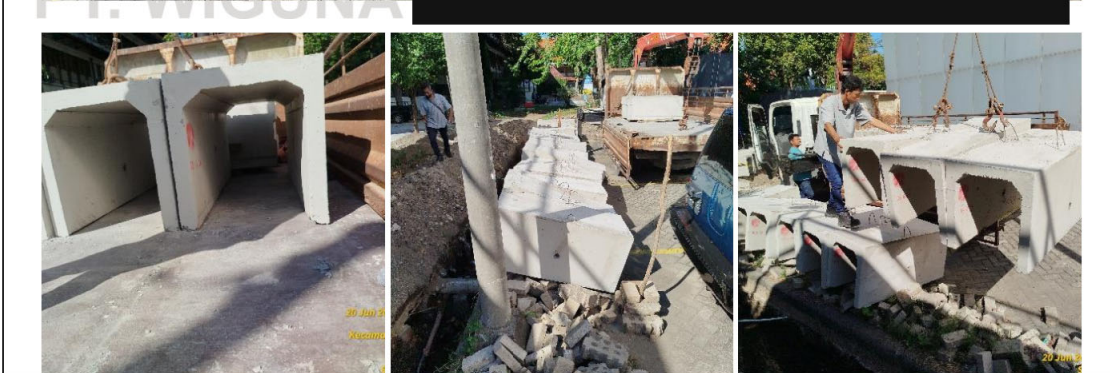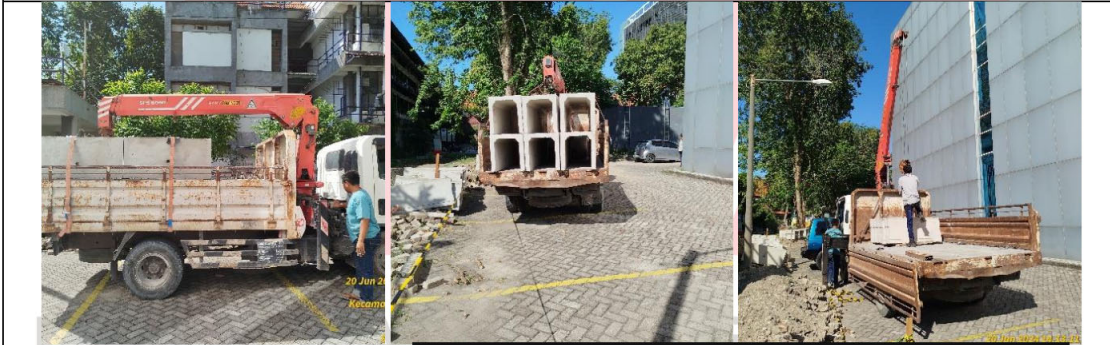

21 Juni 2024 – U-Ditch on site & pekerjaan pemasangan U-Ditch



22 Juni 2024 –Pekerjaan pemasangan U-Ditch




4. Pemasangan Kabel Tray

10 Juni 2024 – Pemasangan hanger beam




20 Juni 2024 – Kabel tray on site & pemasangan kabel tray



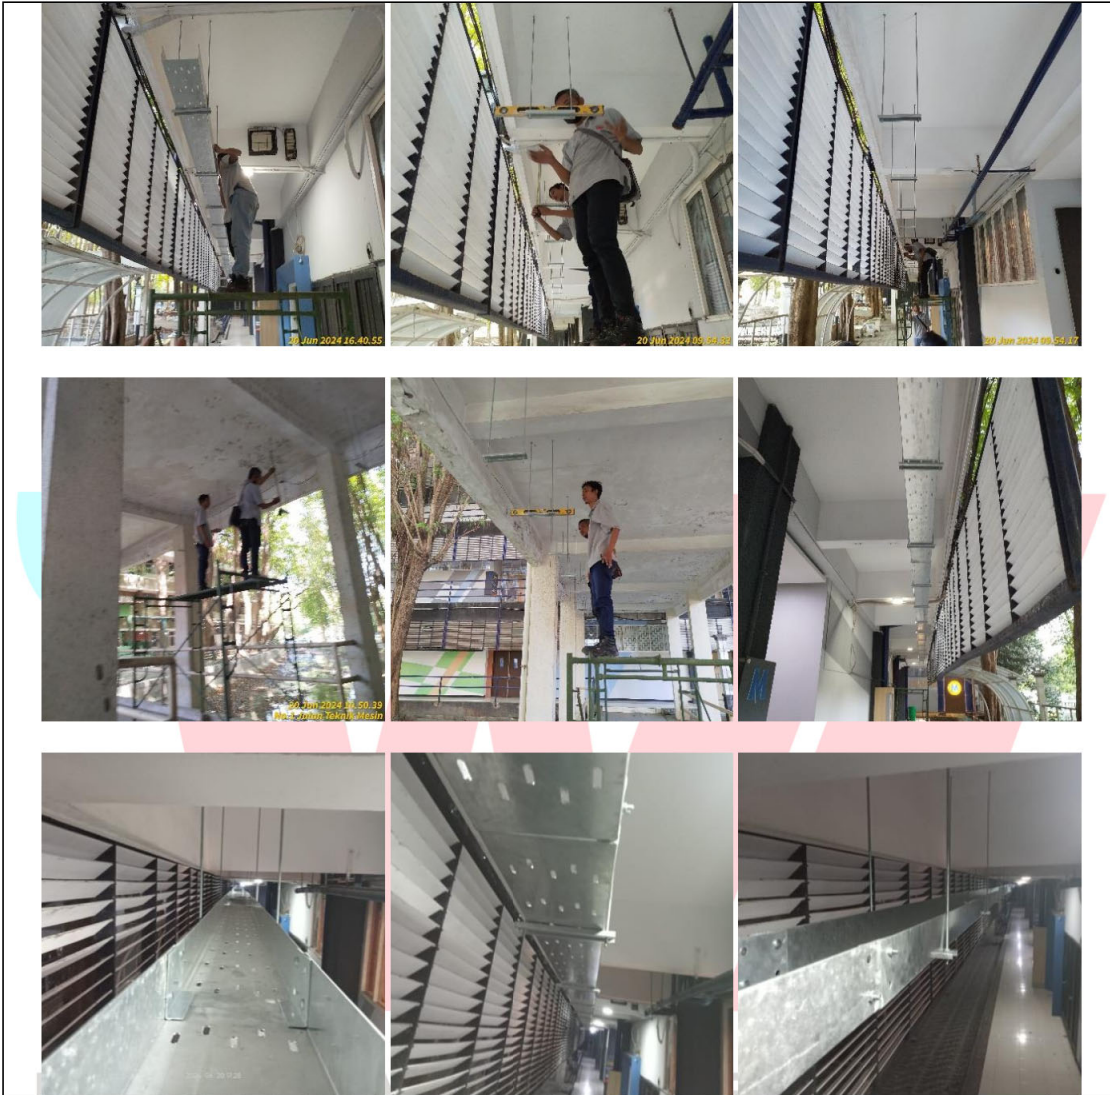

21 Juni 2024 – Pemasangan kabel tray

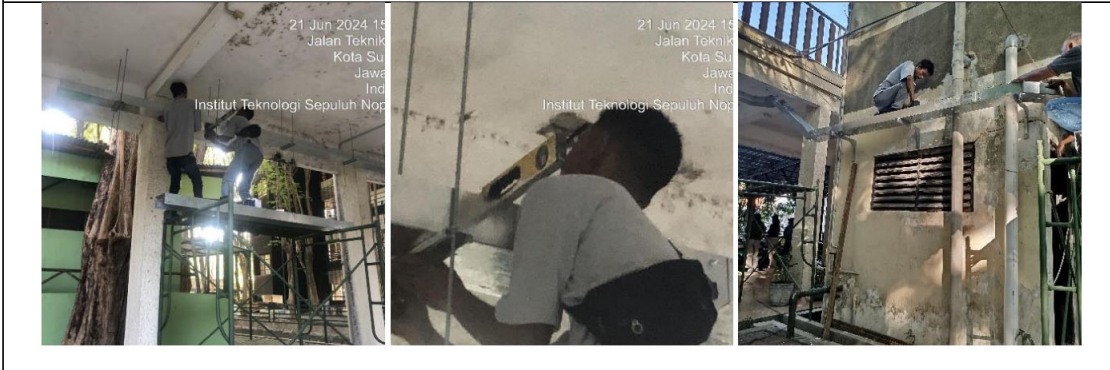










24 Juni 2024 – Pemasangan kabel tray

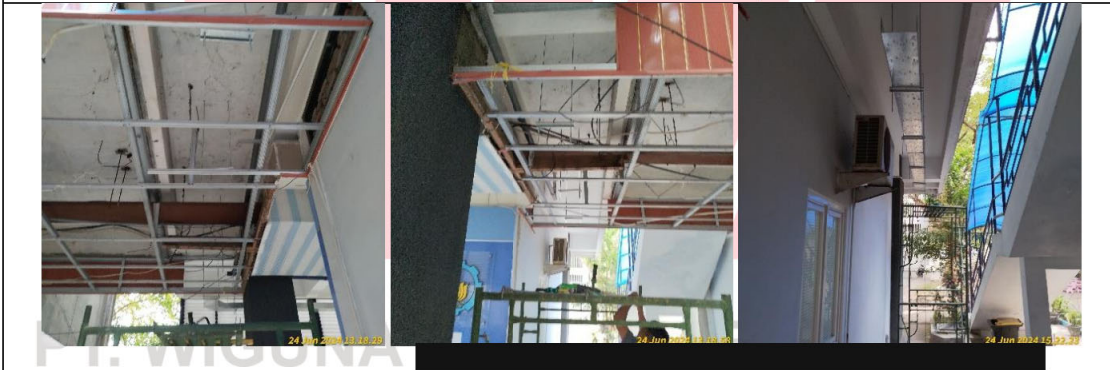

25 Juni 2024 – Pemasangan kabel tray

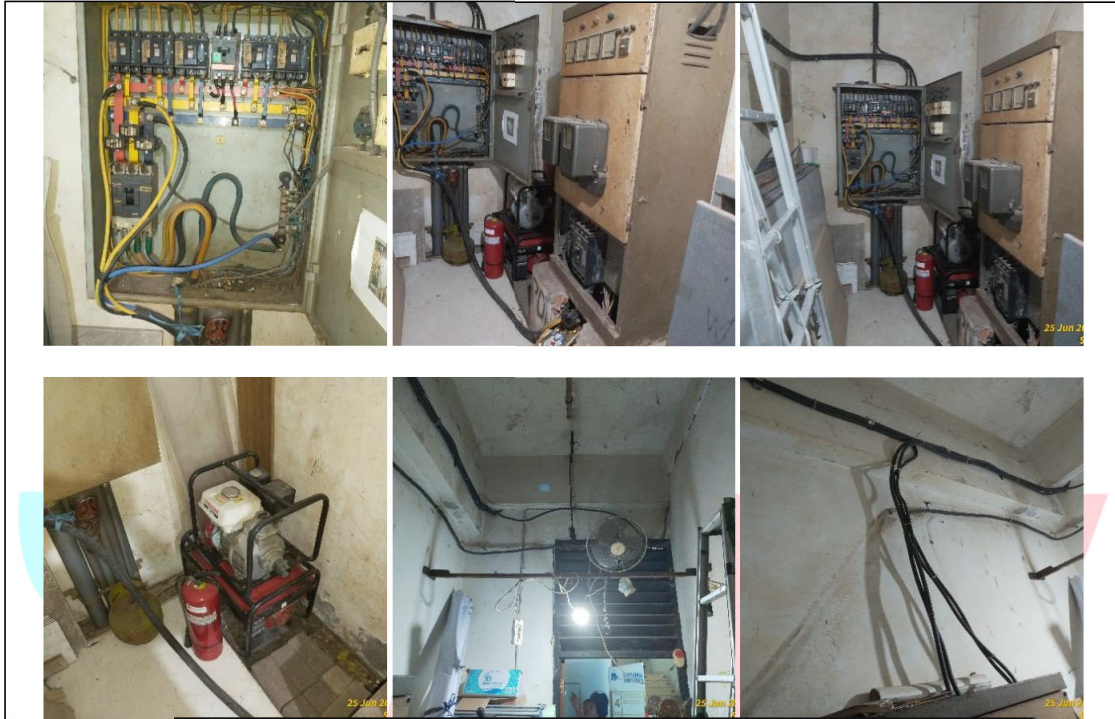

5. Pulling Kabel 4x95mm dan 4x185mm

25 Juni 2024 – Kabel on site



26 Juni 2024 – Pengupasan kabel untuk Insullation Test



26 Juni 2024 - Insullation test Phase to Ground kabel 95mm sebelum dilakukan pulling



26 Juni 2024 - Insulation test Phase to Ground kabel 185mm sebelum dilakukan pulling



26 Juni 2024 - Insulation test Phase to Phase kabel 95mm sebelum dilakukan pulling




26 Juni 2024 - Insulation test Phase to Phase kabel 185mm sebelum dilakukan pulling




26 Juni 2024 – Pulling kabel



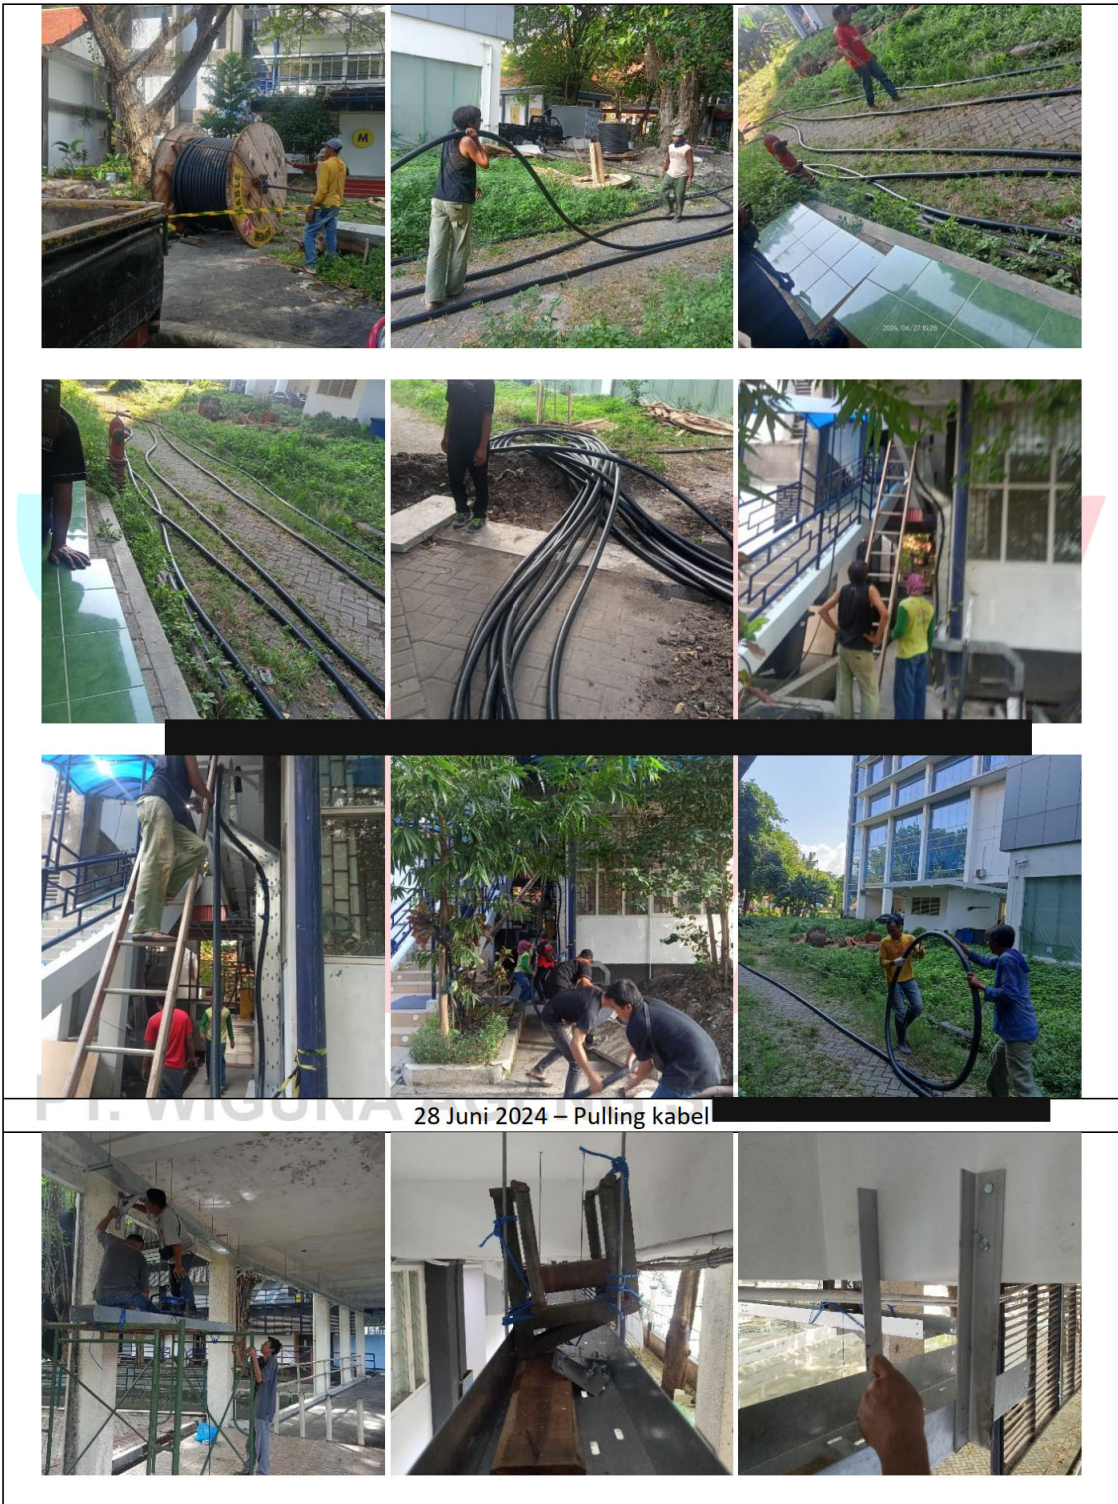



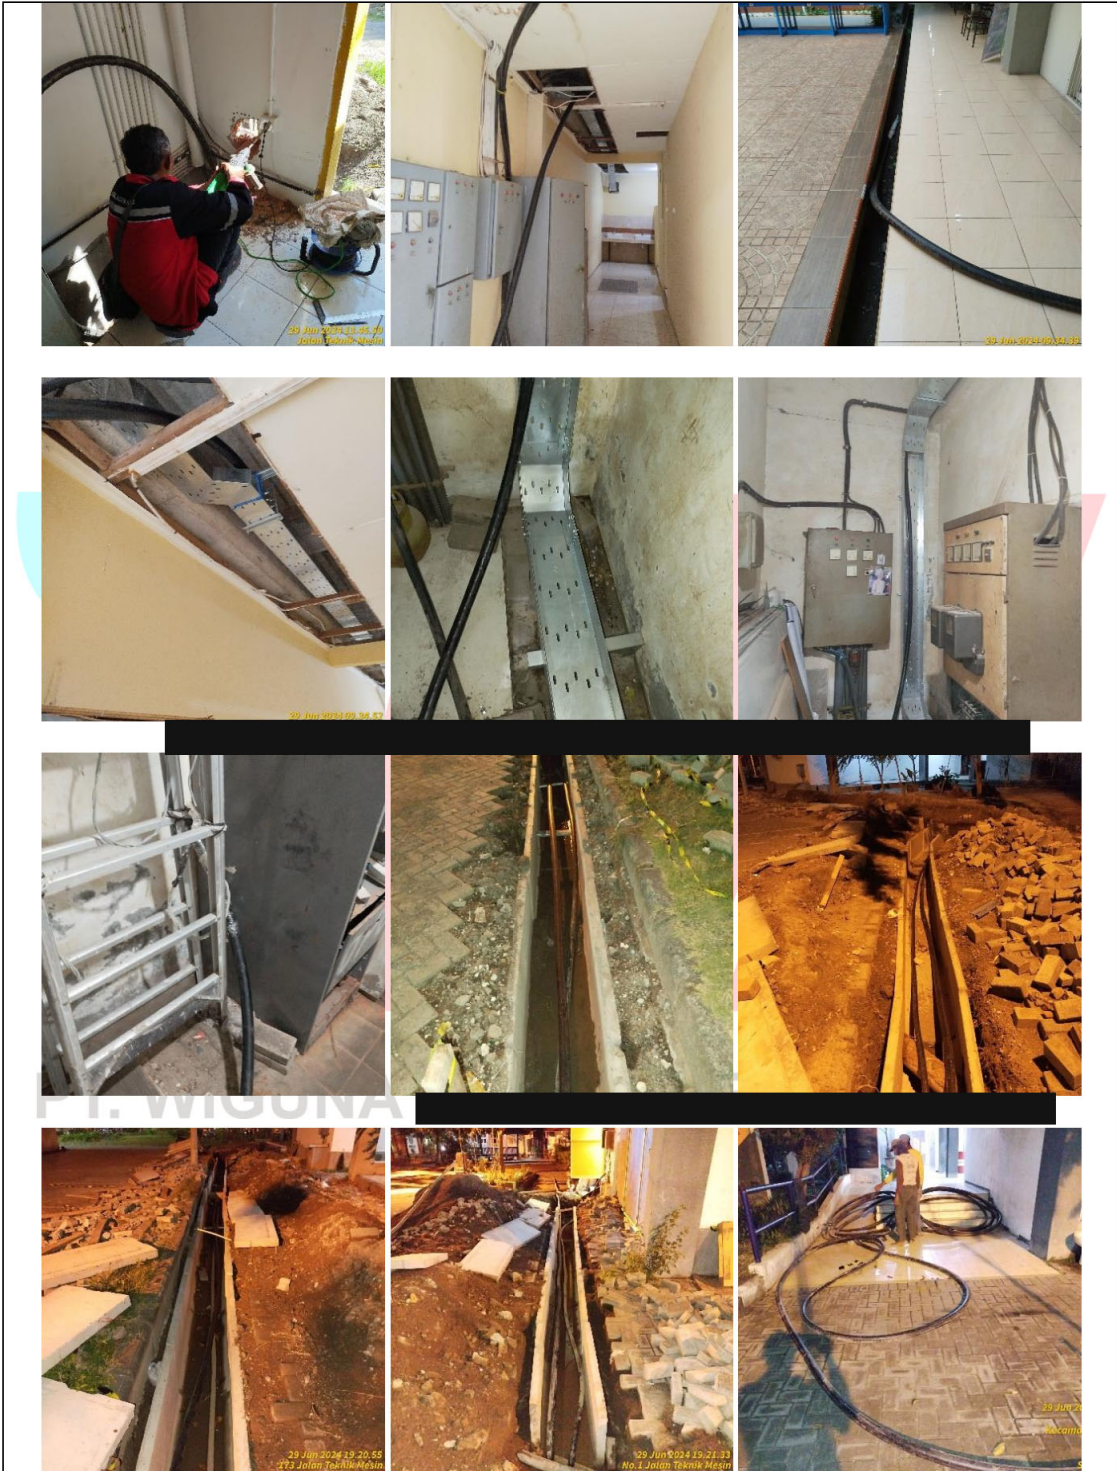


6. Terminasi Kabel

30 Juni 2024 - Phase Rotation test Gedung Biologi sebelum terminasi kabel



30 Juni 2024 - Phase Rotation test Gedung Statistik sebelum terminasi kabel

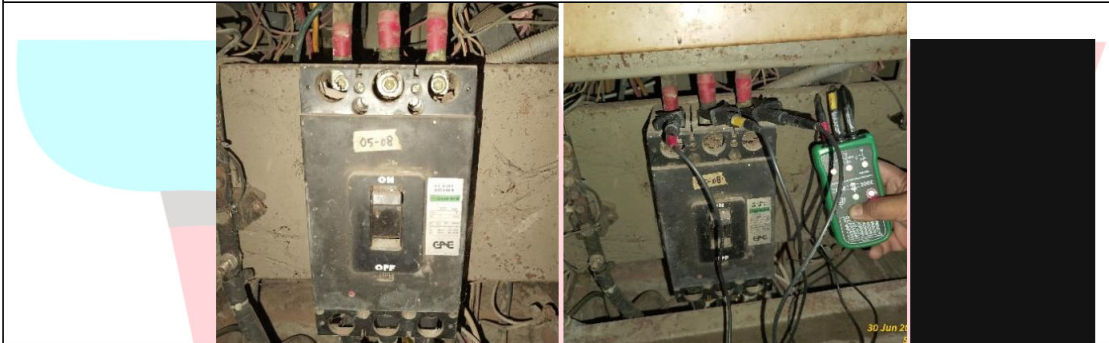


30 Juni 2024 - Persiapan terminasi kabel






30 Juni 2024 - Terminasi kabel Gedung Biologi

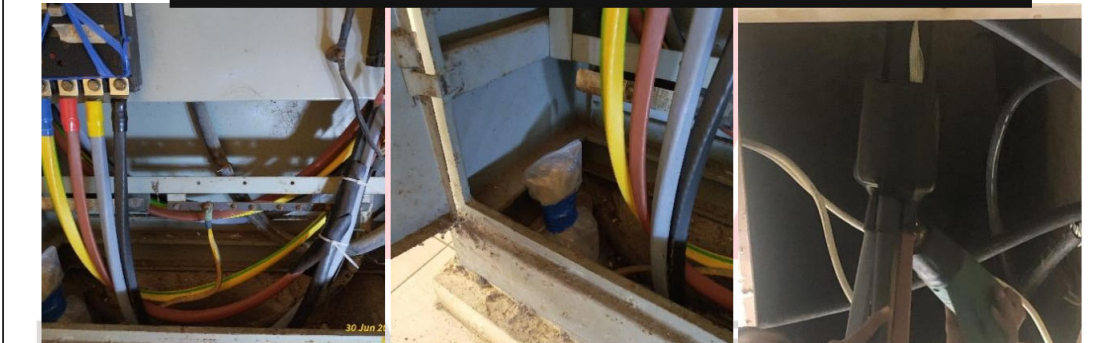

30 Juni 2024 - Terminasi kabel Gedung Statistik

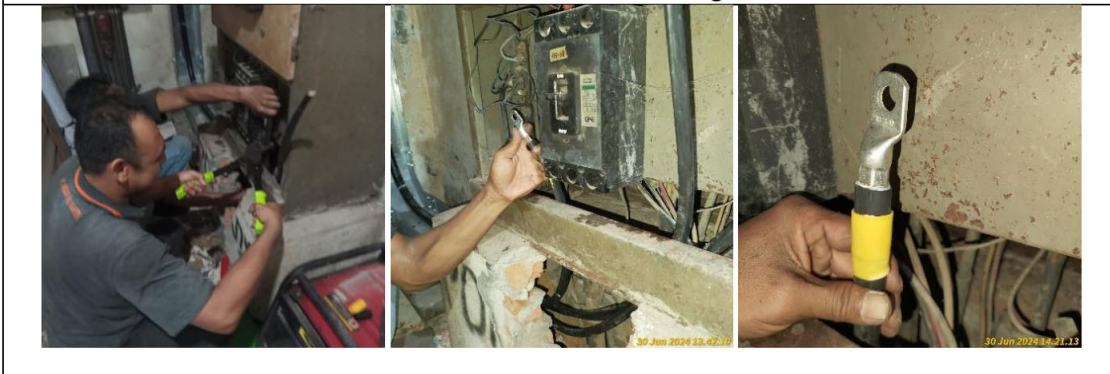





30 Juni 2024 - Terminasi kabel SS



30 Juni 2024 - Insulation test sesudah terminasi kabel 95mm

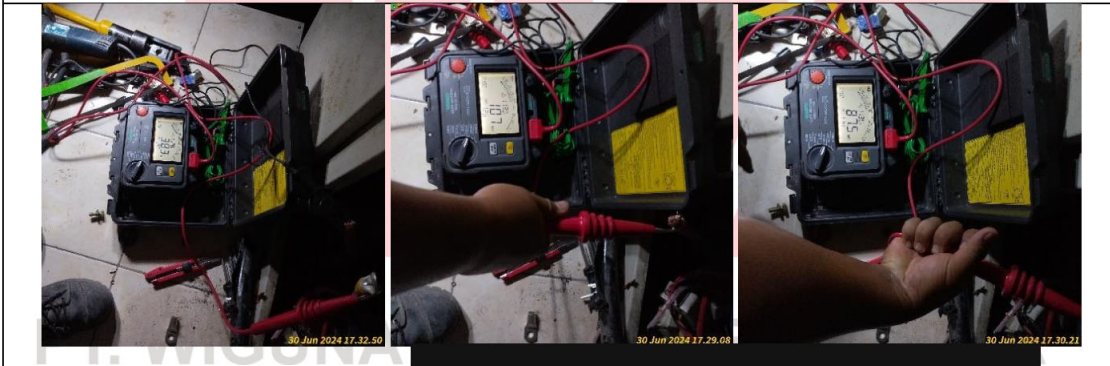

30 Juni 2024 - Insulation test sesudah terminasi kabel 185mm

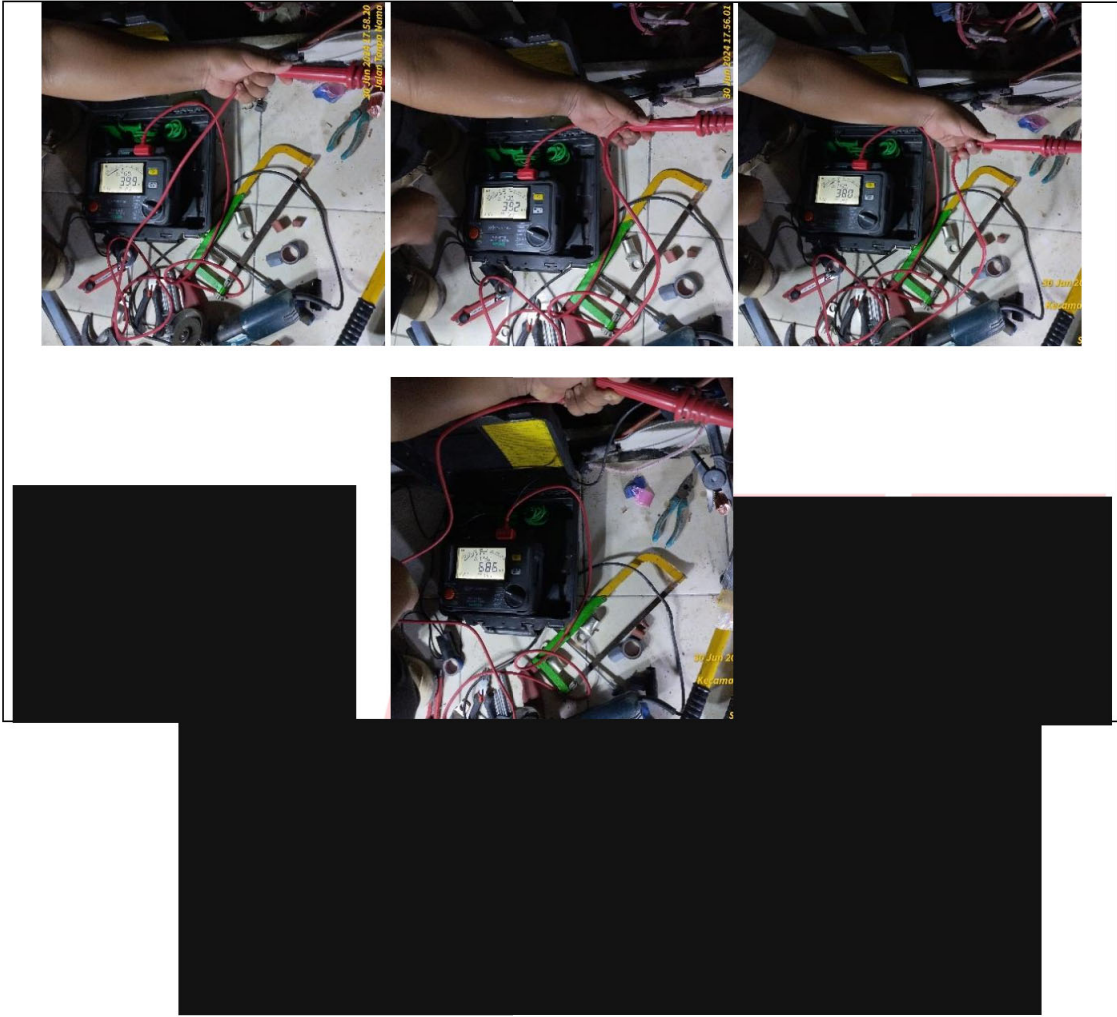

7. Kerja Tambah Penggantian MCCB

30 Juni 2024 – Penggantian MCCB



8. Energize


30 Juni 2024 - Energize



30 Juni 2024- Phase Rotation test dan cek tegangan Gedung Statistik sudah terminasi kabel



30 Juni 2024 - Phase Rotation test dan cek tegangan Gedung Biologi sudah terminasi kabel

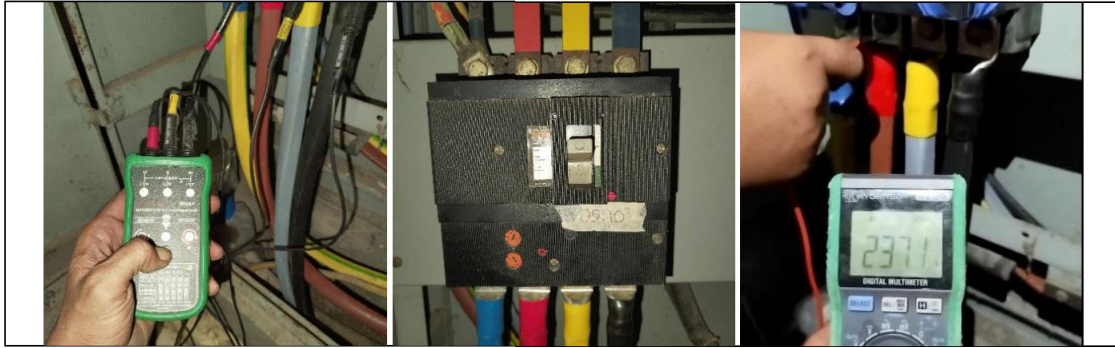

9. Pekerjaan Perapian

30 Juni 2024 – Perapian U-Ditch




1 Juli 2024 - Perapian kabel, plafon dan U-Ditch





2 Juli 2024 – Perapian kabel tray dan U-Ditch



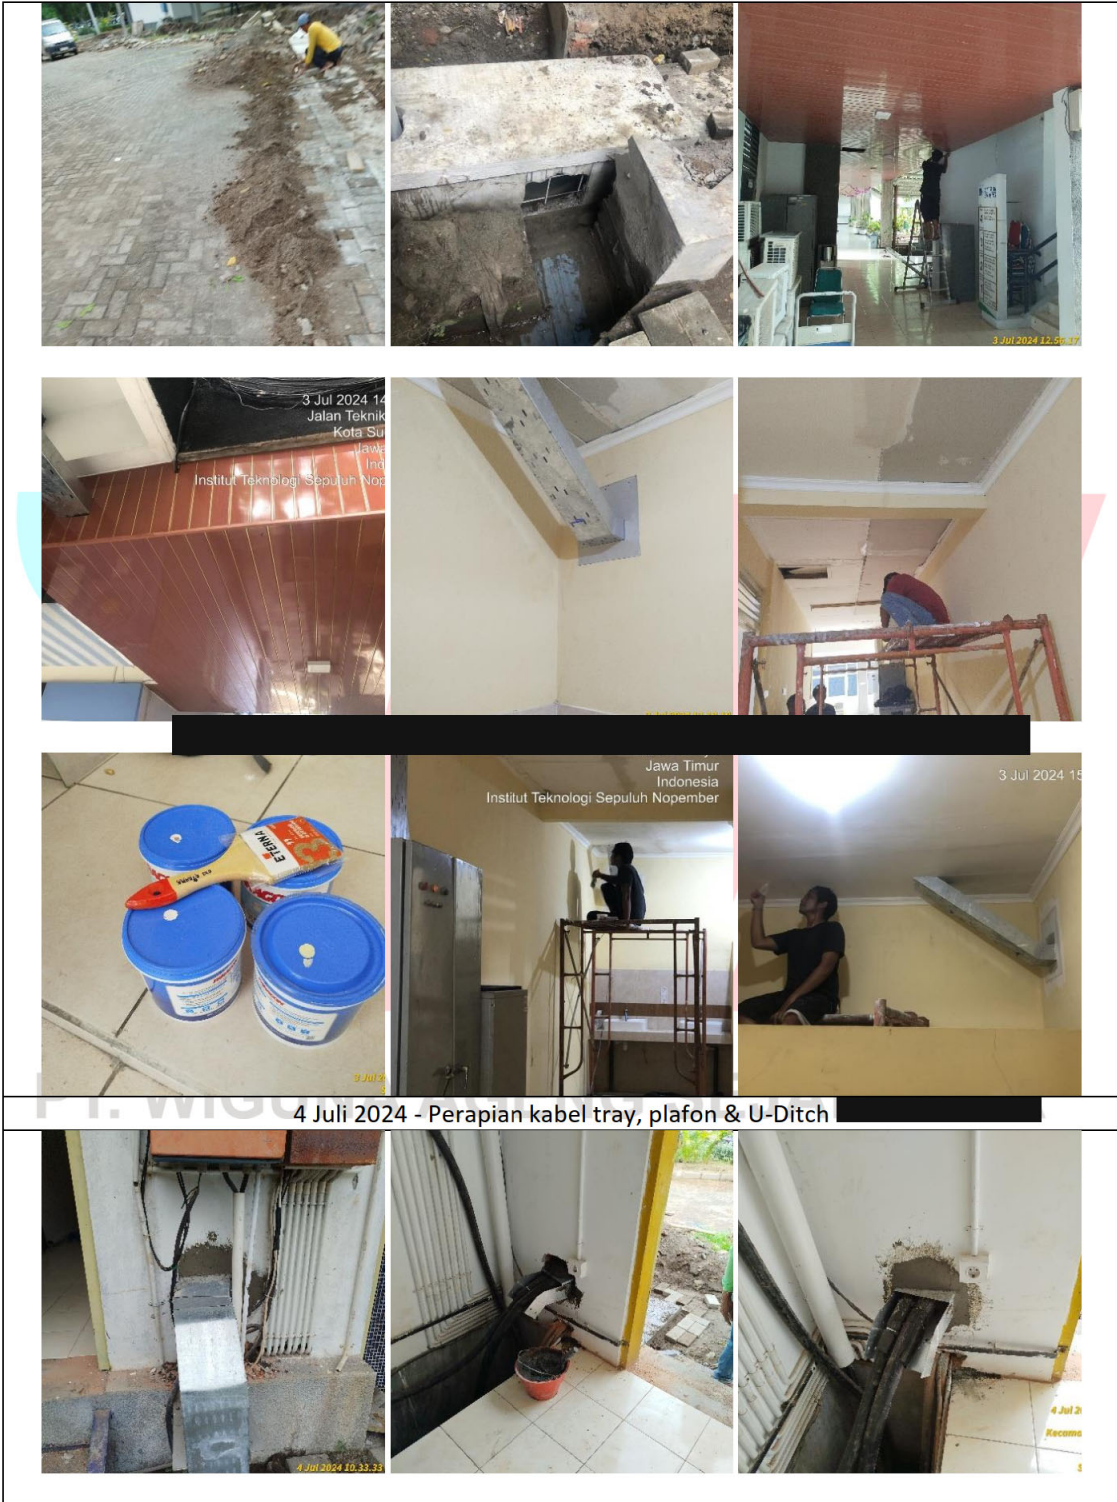



5 Juli 2024 - Perapian U-Ditch & pemberian tanda bahaya pada kabel tray & cover U-Ditch





6 Juli 2024 – Pekerjaan selesai



10. Lampiran Laporan Bulanan

